

# Grundboringer mellem Buran og Eliplads.

Hul nr 1: 2<sup>m</sup> vandholdig sand, 6<sup>m</sup> blød lere

Hul nr. 19: 2<sup>m</sup> vandholdig sand 28<sup>m</sup> blød ler, siden haardt.

Hul nr 56: 2<sup>m</sup> vandholdig sand 5,50 ler, koldblød

"	"	2:	2	6	"
"	"	4:	2	6	"
"	"	5:	2,25	5,75	"
"	"	6:	2,25	27,75	"
"	"	8:	2,00	6,00	"
"	"	9:	2,30	3,50	"
"	"	9:	2,00	6,00	"
"	"	11:	2,00	23,50	"
"	"	13:	2,00	6,00	"
"	"	14:	2,00	6,00	"
"	"	15:	2,00	27,00	"
"	"	16:	2,00	6,00	"
"	"	18:	2,00	6,00	"

4<sup>m</sup> fastere lere, siden haardt.

1,5<sup>m</sup> fastere lere, siden haardt.

Ikke boret dybere


"	"	20:	2,00	6	"
"	"	20:	2,00	6	"
"	"	21:	2,00	6	"
"	"	22:	2,00	6	"
"	"	23:	2,00	6	"
"	"	24:	2,50	5,50	"
"	"	26:	2,50	5,50	"

Ikke boret dybere

"	"	26:	2,00	6	"
"	"	y:	2,00	5	"
"	"	29:	1,5	29,2	"
"	"	32:	1,5	5,5	"
"	"	35:	1,5	4,5	"
"	"	37:	2,8	4,2	"
"	"	39:	2,00	5	"
"	"	40:	2,50 (tørre)	14,5	"
"	"	41:	2,5	2,24	"
"	"	42:	2,00	6,5	"
"	"	43:	1,75	6,25	"
"	"	44:	1,75	6,25	"
"	"	45:	2,00	22	"
"	"	46:	2,00	6	"
"	"	47:	2,00	6	"
"	"	48:	1,75	29,75	"
"	"	49:	1,75	13,62	"
"	"	50:	2,00	6 <sup>m</sup> bløder	"
"	"	51:	2,50	5,50	"
"	"	52:	2,50	5,50	"
"	"	53:	2,50	5,50	"
"	"	54:	2,50	5,50	"
"	"	55:	2,50	22,50	"

"	"	57:	2,50	5,50	ler
"	"	58:	2,50	20,50	"
"	"	59:	2,50	22,50	"
"	"	60:	2,50	5,50	"
"	"	61:	2,50	5,50	"
"	"	62:	1,50	6,50	"
"	"	63:	1,50	6,50	blød ler
"	"	64:	1,50	6,50	"
"	"	65:	1,50	6,50	"
"	"	66:	1,50	14,50	"
"	"	67:	1,50	6,50	"
"	"	68:	1,50	32,50	"
"	"	69:	1,50	6,50	"
"	"	70:	1,50	6,50	"
"	"	71:	1,50	6,50	"

**NB.** Kun de understregede huller er boret, til fast grund er naaet, de øvrige kun til ca. 5<sup>m</sup> dybde.

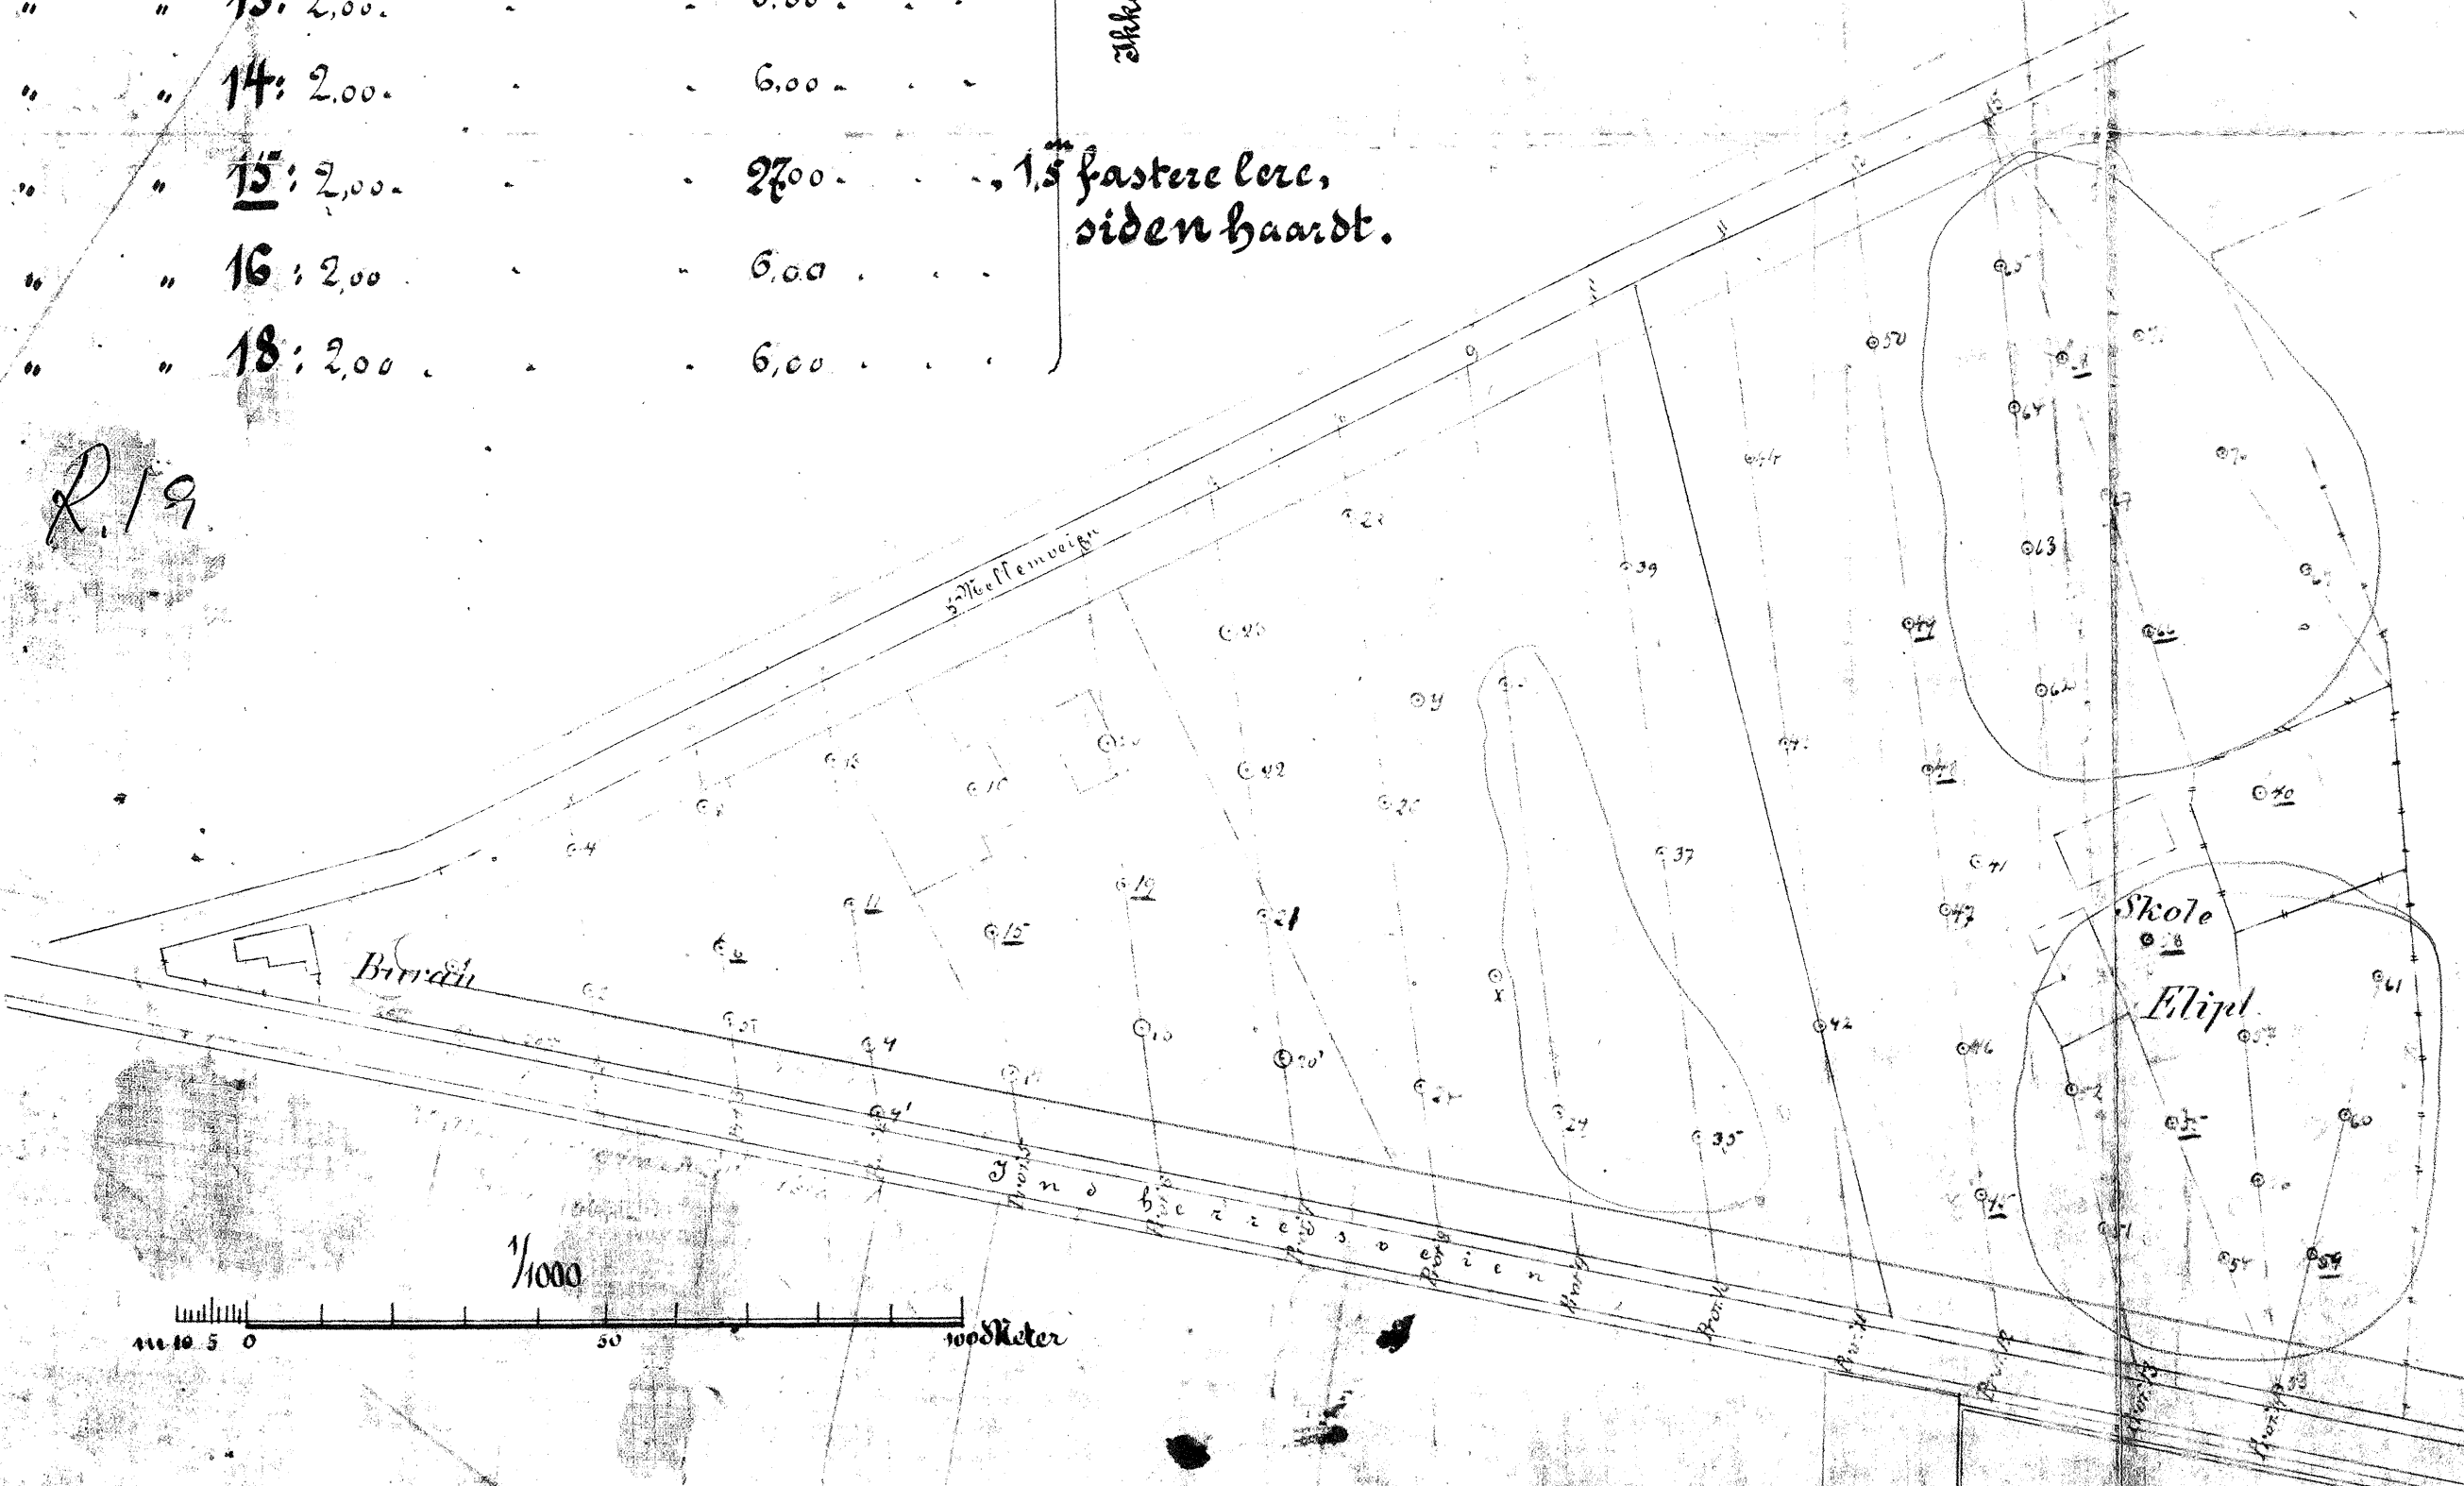

Arkiv nr. <b>2</b> <b>E. 32</b>	Blad 1	GRUNNBORINGSRAPPORT	Borhull nr. ..... .....
------------------------------------	-----------	---------------------	-------------------------------

Sted, plass	Eli plass	Skisser, etc.
Borplassens høyde i forhold til fastpkt. eller midl. havnivå		
Boringen utført	1899	
Metode	Dreiesondering ?	
Formål	Grunnundersøkelse	
Utførende firma - inst.	T.I.V.	
Oppdragsgiver		

Anmerkninger Det ble boret vel 70 hull. Fjellet lå omtrent 25-30 m.u.t. bortsett fra området omkring Lademoen kirke hvor fjellet lå 15-20 m.u.t.  
De første 2-2,5 m. besto av vannholdig sand, siden kom en blöt leire helt til fjell.
