INGENIØRFIRMAET BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad 2

Oppdrag: HAVREVN, MANGLERUD, STORGÅRDEN, SO: G4 IV

Prøvehull: II, III

Dyp i m. regnet fra: topp fylling — Kote: 122,8

Grundvannstand: 3,2 m. under terreng pr. 17-2-58

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeboring
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

427 H

Rekvirent: 6/58 – OSLO Tegnet: 22-2-58 og 16-12-58 L.S.E.

Dyp i m	Jordart	Skjæ.	Prøve	Vannmenighet og konsistensgrenser i %	Rømvekt i t/m³	Skjærfasthet i t/m²	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
	← Topp fylling pr. 1-3-58, kote 122,8							
	Pr. II							
1	Kote 122							
2	121 Fylling — Tørrskorpe, glasskår, planterester etc.							
3	120 Tørrskorpe — Utgravet byggegrube pr. 4-12-58, kote 119,2 tilføyet 16-12-58							
4	119							
5	118							
6	117 Leire							
7	116							
8	115 Antatt fjell — Tynne mosjikt og noen sand- og gruskorn							
	Pr. III							
	Kontroll-prøvehull, utført des.-58							
	Samme beliggenhet som Pr. II							
	← Topp fylling pr. 1-3-58, kote 122,8							
0 m.	Kote 122							
1	121							
2	120							
3	← Utgravet byggegrube pr. 4-12-58, kote 119,2							
4	Tørrskorpe							
5								
6	117 Ren leire, homogen.							
7	116 Prøve, ikke analysert							
8 m.	115 Antatt fjell							

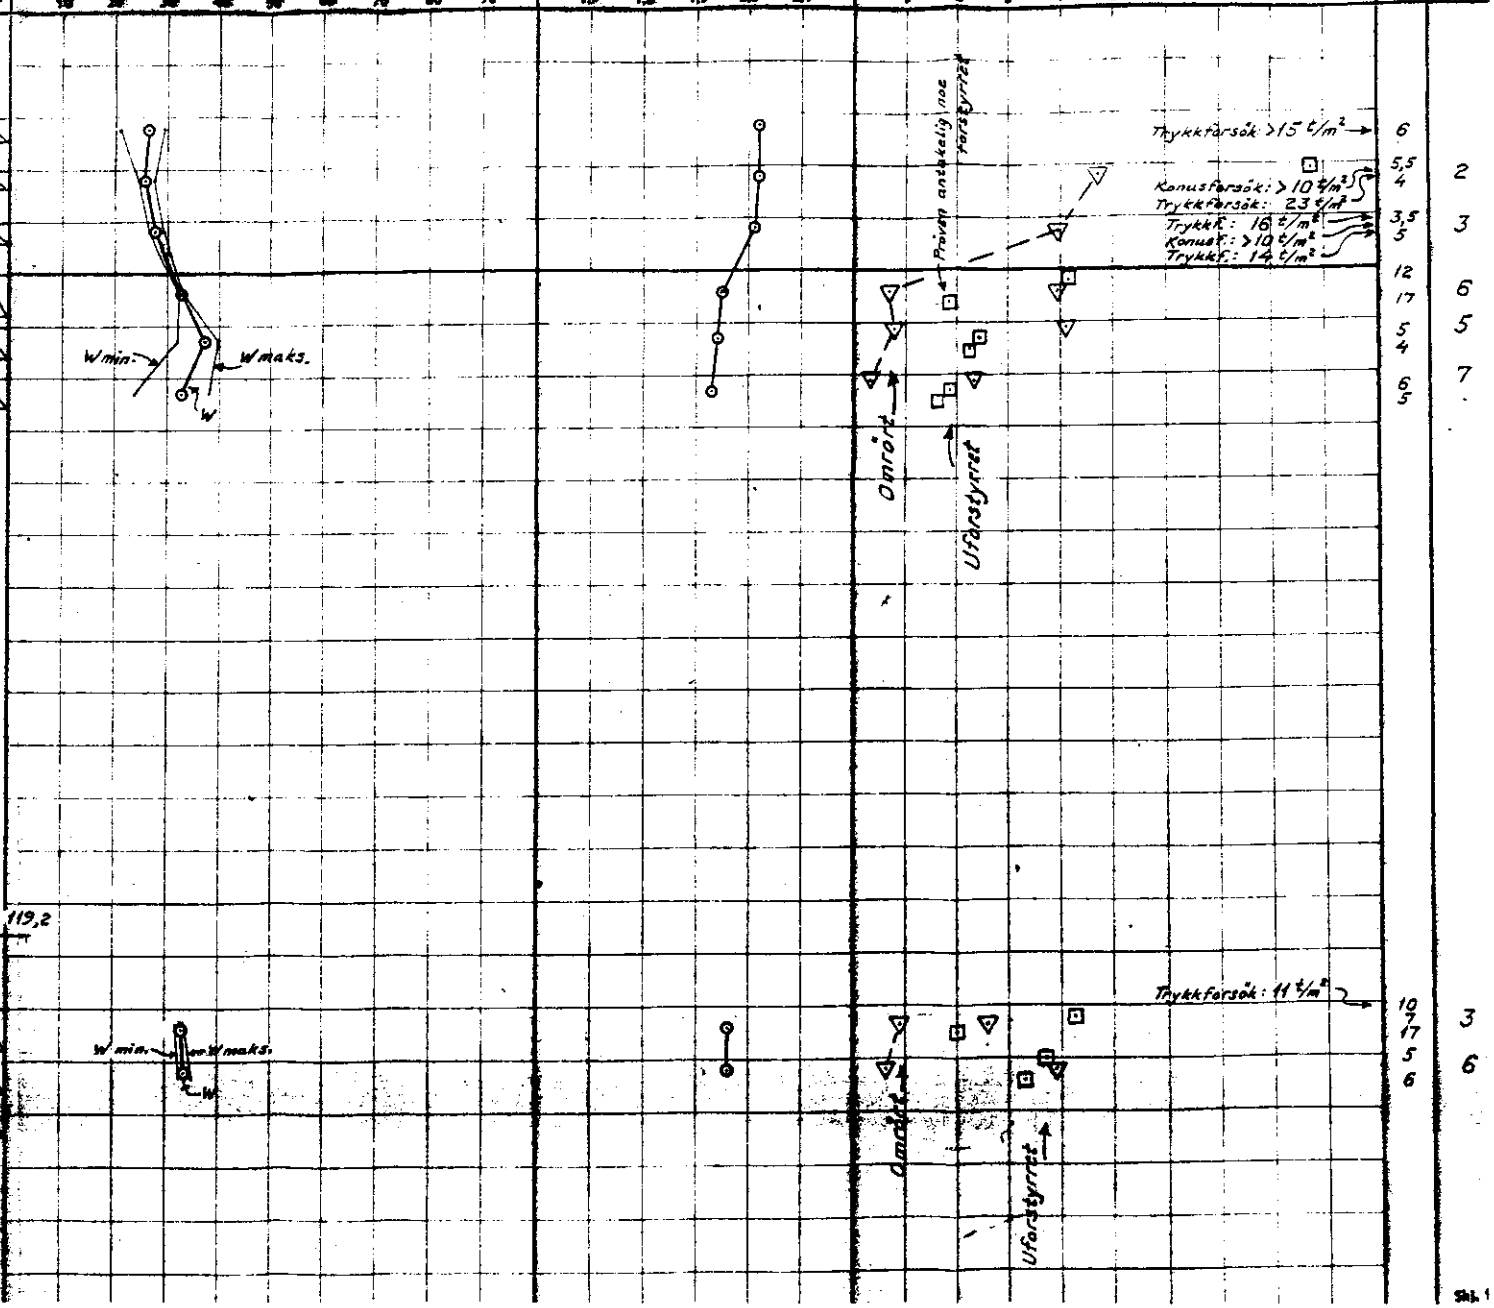

Skj. 1
