50: C 2 I

GRUNNUNDERSØKELSER

Observ.bok nr. 4 side 9-10
Lab.bok nr. 25 side 74-96
Borhull nr. 6

Boringsplass *Bispehavna, Profil B-B, Borhull nr. 6*

Terrengkote: m. Bunnkote: *-6.7* m. Fjellkote *-34.9* m.

Grafisk opptegning av prøveresultater.

Kote	V	F	H_1	H_3	H_3/H_1	K	O	K_o	pH	Gl.t.	y	Anmerkninger
-8.5	54.0	43	9	71	7.9	1.8	1.4	1.6	8.0		1.77	Gytjeholdig leire
-9.5	52.1	39	9	73	8.1	1.9	1.0	1.8	8.0		1.83	— " — " —
-10.6	51.6	42	10	83	8.3	2.1	1.4	1.9	8.0		1.81	Leire
-11.5	51.3	43	12	100	8.3	2.6	1.2	2.4	8.0		1.75	"
-12.5	50.3	45	15	104	7.0	2.6	1.1	2.4	8.0		1.73	"
-13.5	52.8	46	18	110	6.1	2.8	1.2	2.6	9.0		1.84	"
-14.6	50.8	43	20	113	5.7	2.8	1.2	2.6			1.87	"
-15.6	48.0	43	36	163	4.5	3.8	2.2	3.3	8.0		1.89	"
-16.5	55.8	54	25	132	5.3	3.2	1.1	3.0			1.79	"
-17.4	54.8	55	36	168	4.7	3.9	1.0	3.6	8.0		1.81	"
-18.4	55.5	55	20	140	7.0	3.4	0.9	3.2			1.80	"
-19.6	52.2	50	35	253	7.2	5.1	0.8	4.8	8.0		1.85	"
-20.4	51.7	52	27	124	4.6	3.0	Sp	3.0			1.85	"
-21.5	48.9	41	25	132	5.3	3.2	Sp	3.2	8.0		1.90	"
-22.7	50.2	49	45	189	4.2	4.3	0.9	4.0			1.87	"
-23.5	50.3	48	42	172	4.1	4.0	0.9	3.8	8.0		1.87	"
-24.5	49.5	46	38	184	4.8	4.2	1.0	3.9			1.86	"
-25.5	53.5	50	26	149	5.7	3.5	0.9	3.3	8.0		1.80	"
-26.7	54.3	51	23	163	7.1	3.8	0.9	3.6	8.0		1.79	"
-27.4	48.8	41	21	113	5.4	2.8	Sp	2.8	8.0		1.88	"
-28.4	50.5	43	21	110	5.2	2.8	Sp	2.8	8.0		1.85	"
-29.4	48.8	41	23	110	4.8	2.8	Sp	2.8	8.0		1.88	"
-31.1	48.9	41	28	140	5.0	3.4	Sp	3.4	8.0		1.86	"

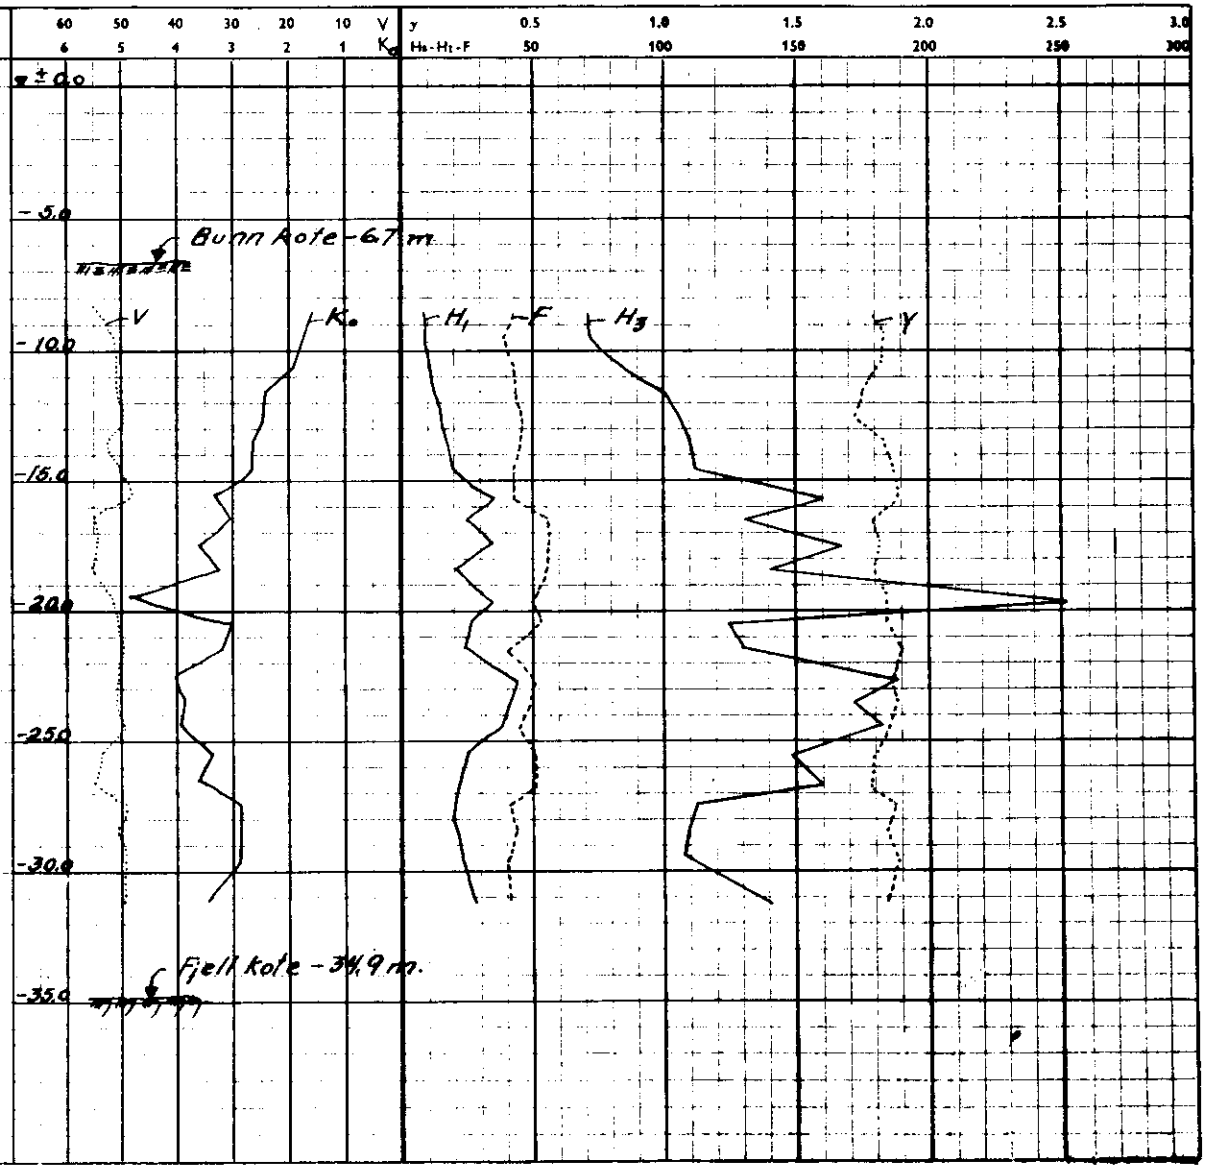

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ finhet
H_1 = relativ fasthet i omrørt prøve
H_3 = relativ fasthet i usmurt prøve
K = skjærfasthet i tonn p. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans
K_o = skjærfasthet i tonn pr. m² redusert i. f. t. humusinnholdet Ö
pH = surhetsgrad (< 7 angir sur reaksjon, > 7 angir basisk reaksjon)
Gl.t. = glødetap i vektprosent av tørrsubstans
y = volumvekt i tonn pr. m³

Arbeidet utført for: *Oslo havnevesen*

tegn nr.: *1007*

Oslo, *3 mars 1943*

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

N 911
