SO:C 2 I

GRUNNUNDERSØKELSER

Observ.bok nr. 4 side 14
Lab.bok nr. 26 side 40 - 52
Borhull nr. 2

Boringsplass Bispehavna, Profil B-B, Borhull nr. 2.

Terrengkote: m. Bunnkote: − 7.60 m. Fjellkote −25.80 m.

Kote	V	F	H_1	H_3	H_3/H_1	K	O	K_e	pH	Gl.t.	γ	Anmerkninger
12.0	49.8	47	35	127	3.6	3.1	1.1	2.9	8.0		1.84	Leire
13.0	41.1	29	29	267	9.2	5.2	1.1	4.8	8.0		2.03	Leire, melsandig
14.0	41.1	32	60	296	4.9	5.5	1.1	5.1			2.03	" "
15.0	52.0	51	42	189	4.5	4.3	0.9	4.0	8.0		1.86	Leire
16.0	50.1	48	47	281	6.0	5.4	0.9	5.1			1.89	"
17.0	50.5	49	45	296	6.6	5.5	0.9	5.2	8.0		1.88	"
18.0	46.5	39	32	172	5.4	4.0	Sp	4.0			1.94	"
19.0	46.2	39	35	172	4.9	4.0	Sp	4.0	8.0		1.94	"
20.0	40.3	50	38	168	4.4	3.9	Sp	4.0			2.02	Finsandblandet leire
21.0	42.5	33	44	241	5.4	5.0	Sp	5.0	8.0		1.99	Leire med sandkorn
22.0	54.2	51	24	163	6.8	3.8	0.9	3.6	8.0		1.80	Leire
23.0	47.9	41	20	124	6.2	3.1	Sp	3.1			1.88	"
24.0	48.8	40	24	107	4.5	2.7	Sp	2.7	8.0		1.92	"

Grafisk opptegning av prøveresultater.

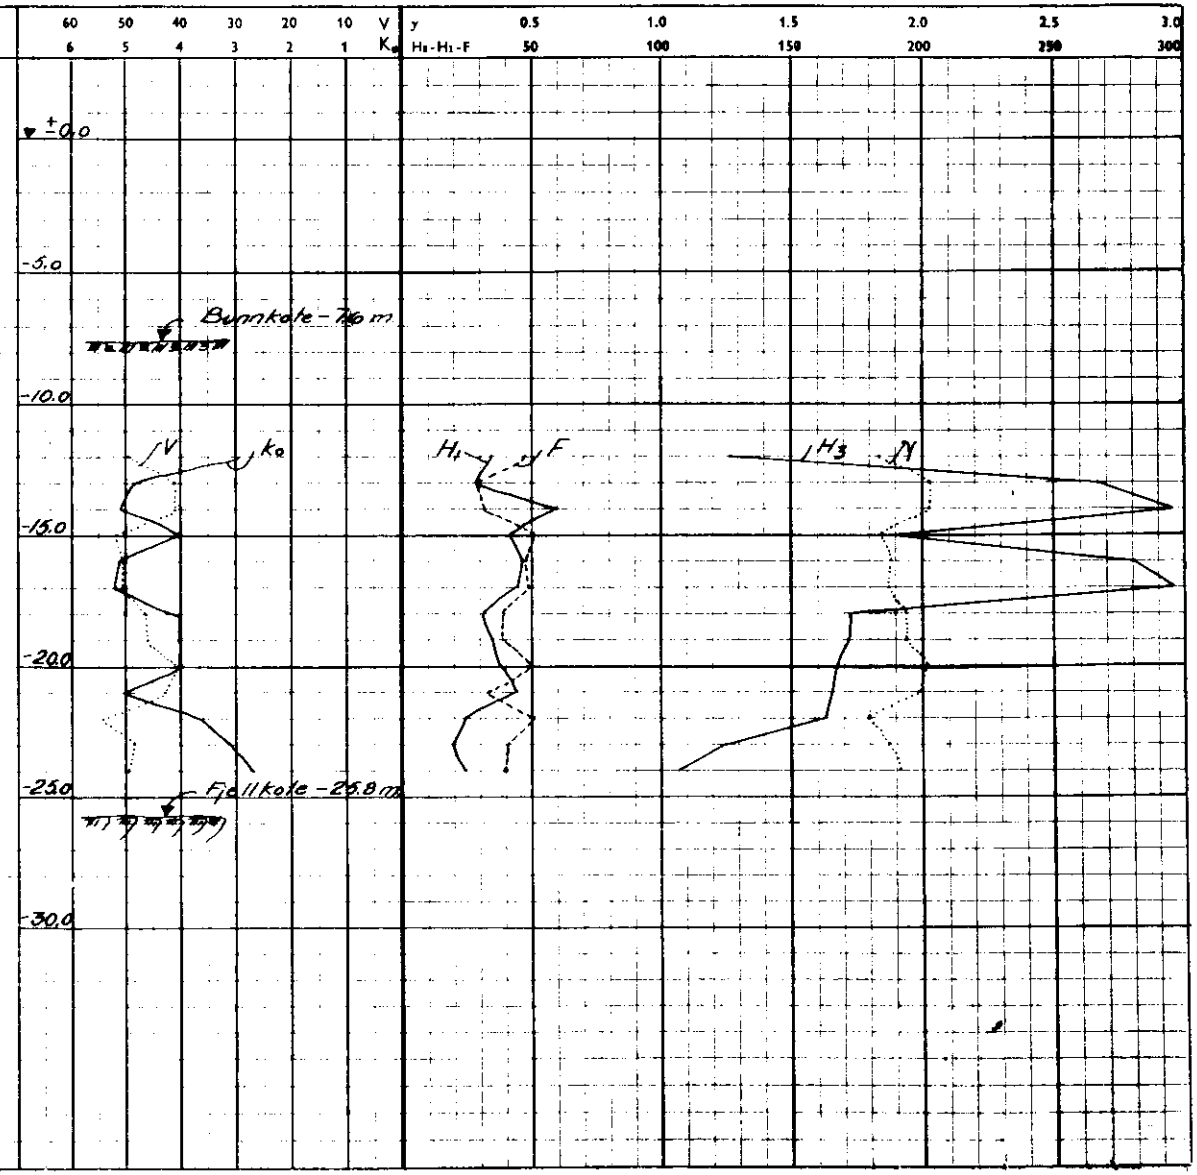

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ finhet
H_1 = relativ fasthet i omrørt prøve
H_3 = relativ fasthet i uomrørt prøve
K = skjærfasthet i tonn p. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans
K_e = skjærfasthet i tonn pr. m² redusert i. f. t. humusinnholdet O
pH = surhetstall (< 7 angir sur reaksjon, > 7 angir basisk reaksjon)

Arbeidet utført for: Oslo havnevesen

tegn nr.: 1010

Oslo, 5 oktober 1943

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

112 N
