SOG 01

Dybde (m)	Beskrivelse		Prøve	Forsøk	Vanninnhold (%)	Romvekt (kN/m³)	Porøsite (%)	Humus (%)	Skjærstyrke (kN/m²)	S_t Konus
	LEIRE	tørrskorpe	1							
	LEIRE	tørrskorpe	2							
2	LEIRE	tørrskorpeaktig	3							
	LEIRE	tørrskorpeaktig	4							
4	LEIRE	tørrskorpeaktig meget fast	6							6
	LEIRE	enkelte spredte sandkorn	7							7
6										
	LEIRE	middels fast sandkorn	9							2
8	LEIRE	bløt m/ sandkorn enkelte gruskorn	10							8
	LEIRE	m/ noe finsand/silt sjikt	11							9
10	(tom sylinder)		12							

427 T

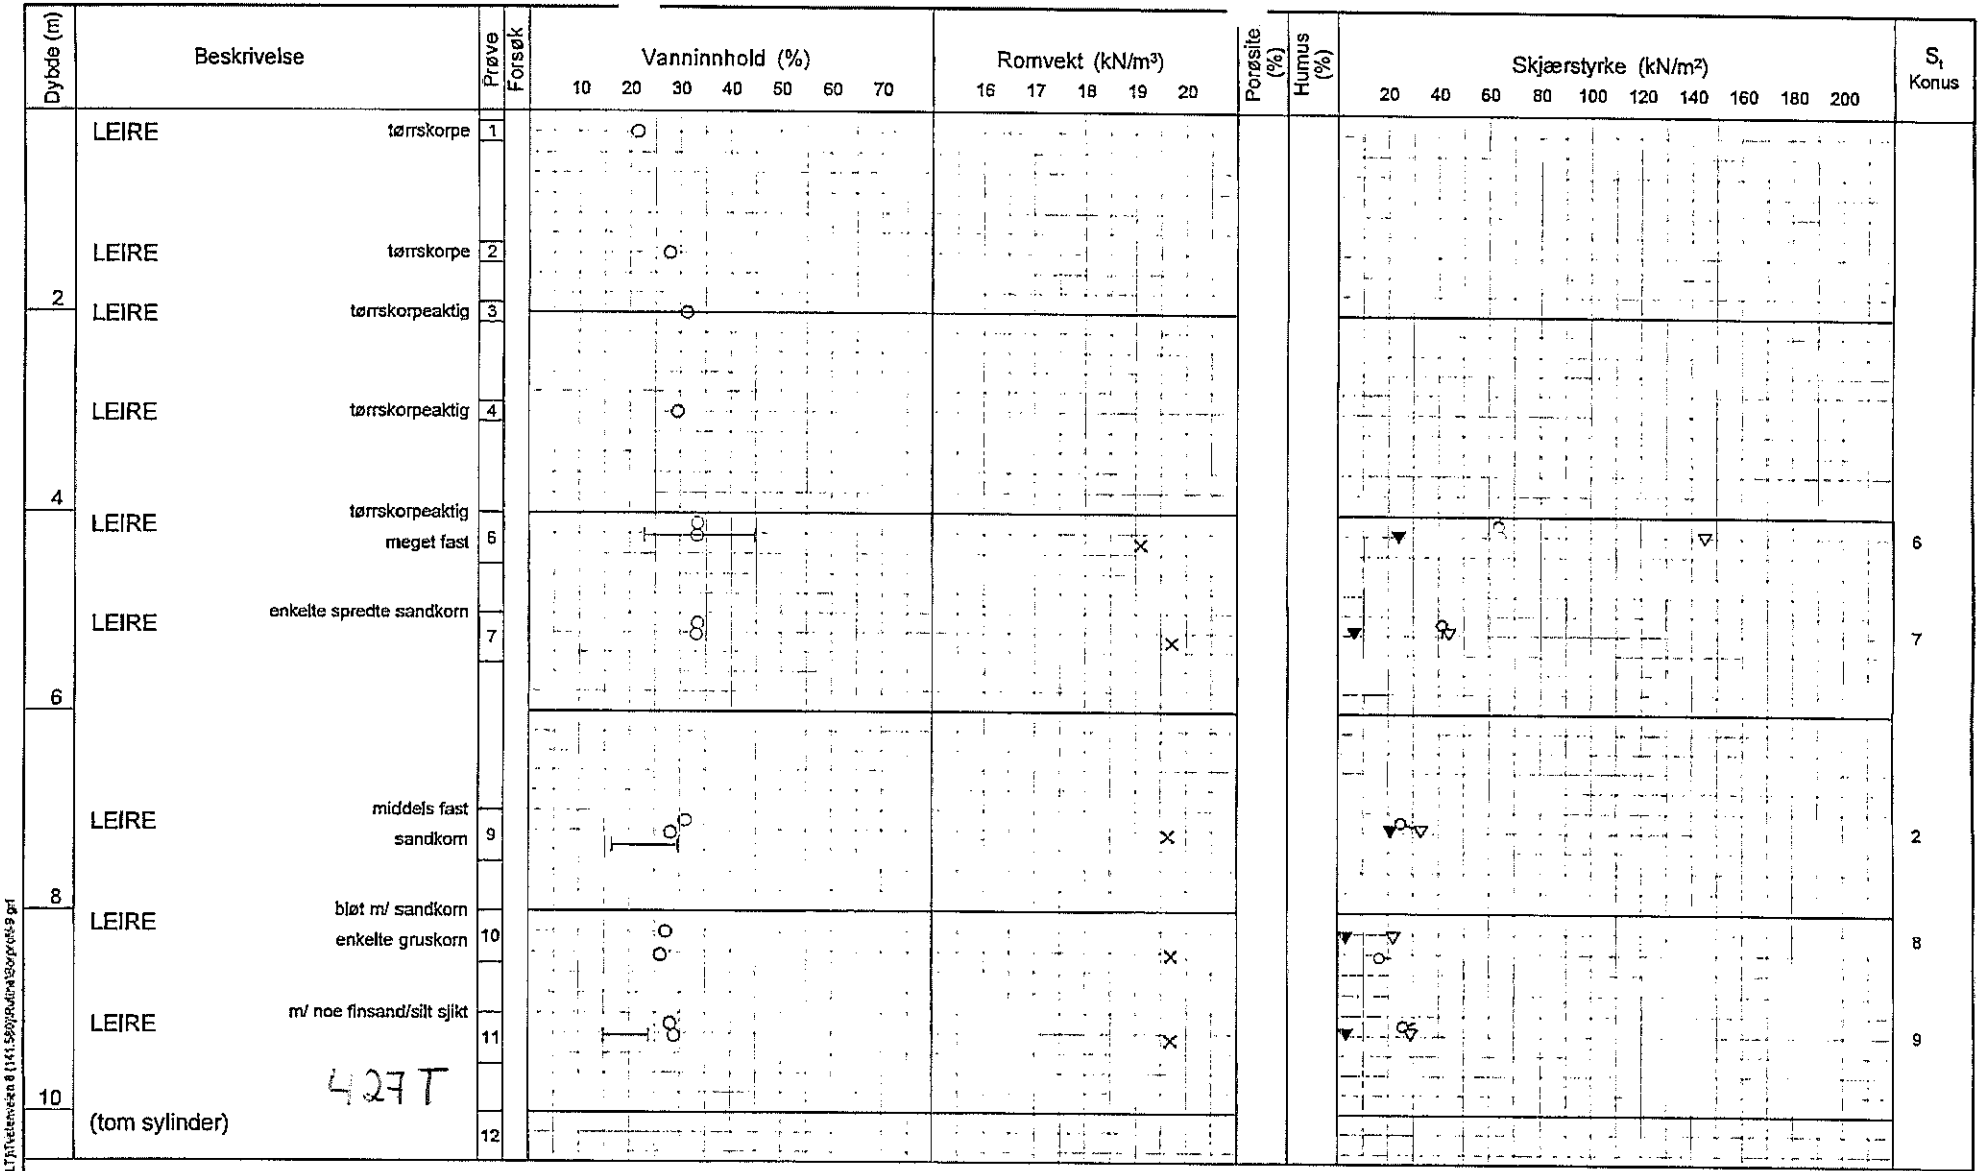

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15–0–5 (0, 10) Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- + Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

TVETENVEIEN 8

Borprofil

Borpunkt nr.: 9

Prøvetype: 50 mm
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-05-27

Date-Rev. no.: 22.04.05-0

Rapport nr.	Figur nr.
5012924	003
Tegner	Dato 2009-06-19
Kontrollert	
Godkjent	

NGI

H:\LASDATA\2009\20091010 (NORCONSULT)\Tvetenveien 8 (141.580)\Rutine\Borprofil-9.grf

SOG 01

427 T
