365U

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
	LEIRE bløt, homogen noe sand-/gruskorn	1	
5	LEIRE bløt til middels fast homogen, noe sand-/gruskorn noe skjellrester	2	
	LEIRE bløt, homogen noen få gruskorn noe skjell	3	
10	LEIRE bløt, homogen enkelte skjellrester	4	
	LEIRE bløt, homogen sandlomme horisontalt silt/sandlag d=11,6m	5	
	LEIRE bløt, homogen	6	
15	LEIRE bløt spredte lommer med silt/sand spredte gruskorn	7	
20			

365U
SOC 1 III

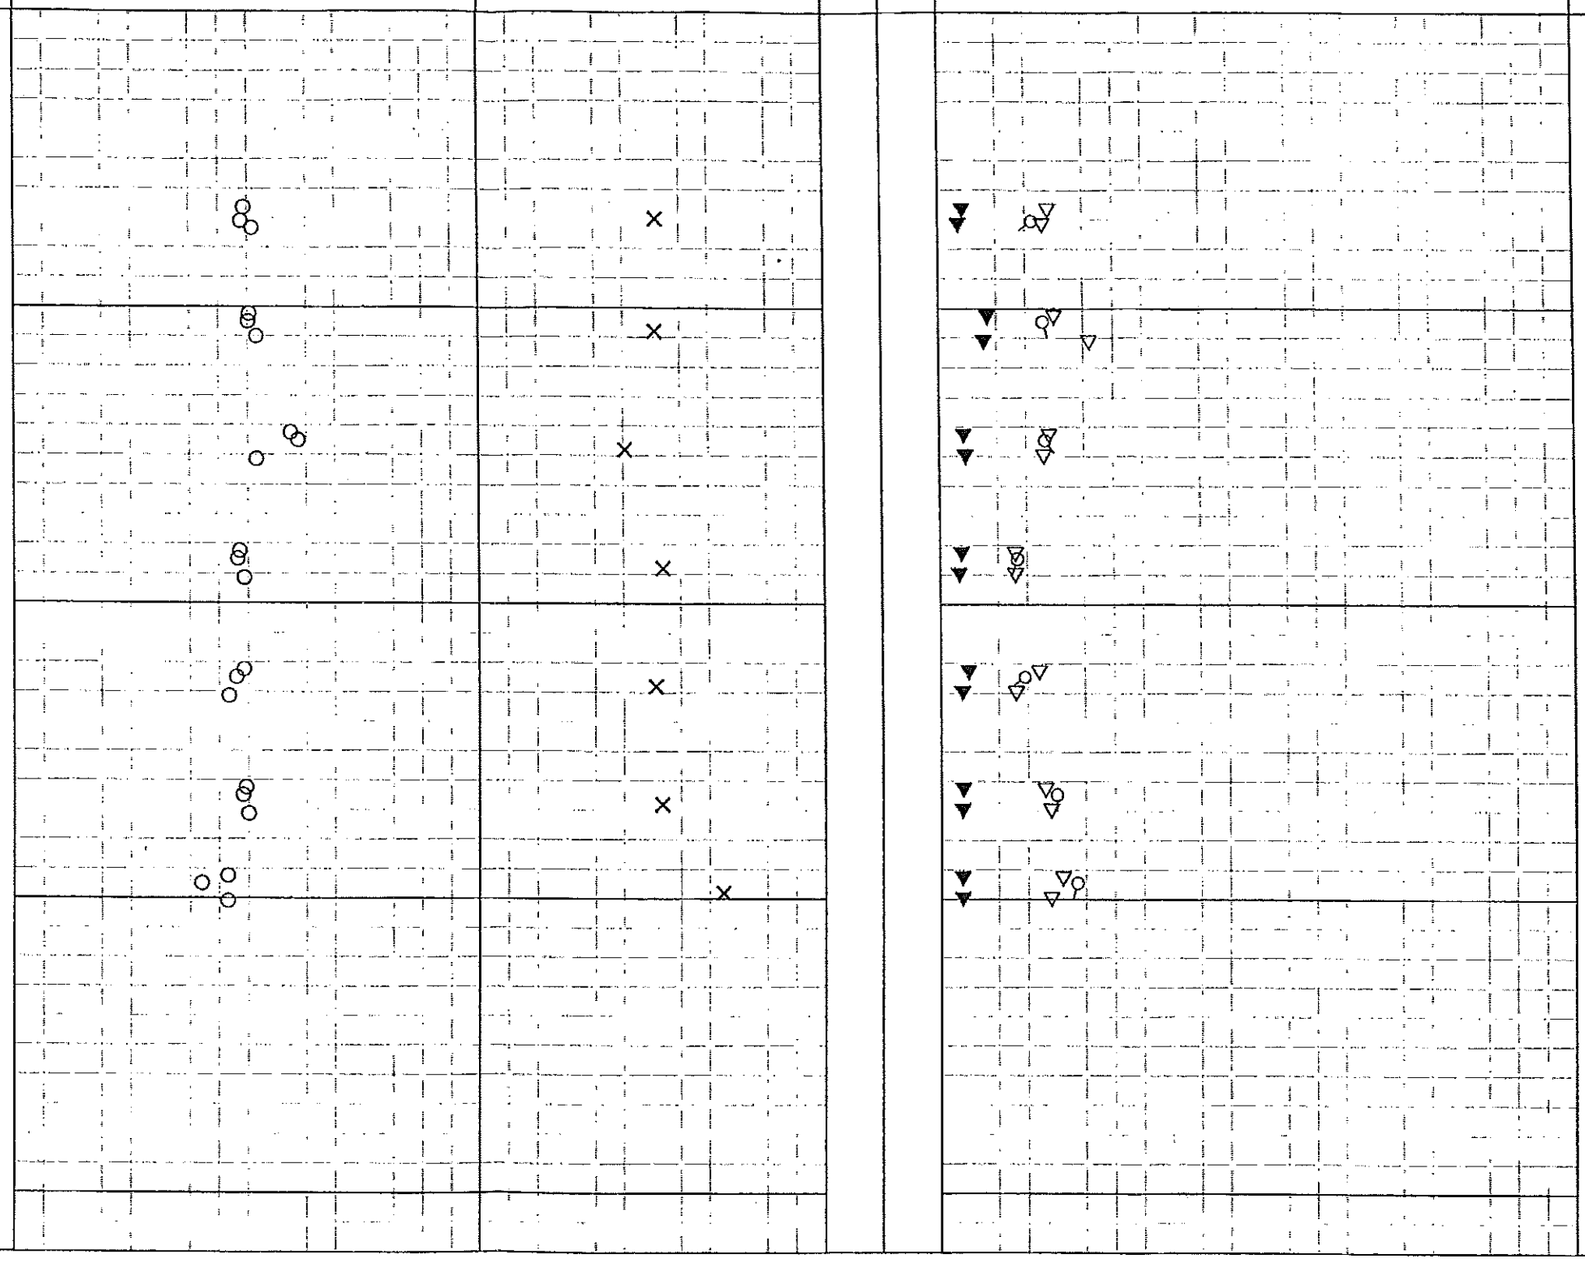

Boret for VAV

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15–0–5 (10) Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- + Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Dato/Rev. 2009-08-21/1

MIDGARDSORMEN, S25 STRANDGATA PUMPESTASJON

Dokumentnr. 20081387-xx-xxx-XX

Borprofil

Borpunkt nr.: E8

Prøvetype: 54mm
Terrengkote: 2.29 m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-10-07

Dato 2009-10-30

Figurnr. B2

Tegner TG MMS

NGI

H:\LABDATA\20081200813870ktober-09\Rutinet\Borprofil_E8.grf
