BORRESULTAT

BORINGENS ART	DYP	KOTE	GJENNOMBORET MATERIALE	METER	KJERNETAP % (1 50 100)	VANNGJ.GANG L/M/MIN	MERKNAD
DIAMANTBORING ⌀ 46MM	0,00	+5,70	FYLLING				
	0,75	+4,95	FJELL	5	0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					34,0		
					46,7		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
	12,60	-6,90					
				10			
				15			
				20			

SOB1

R-927

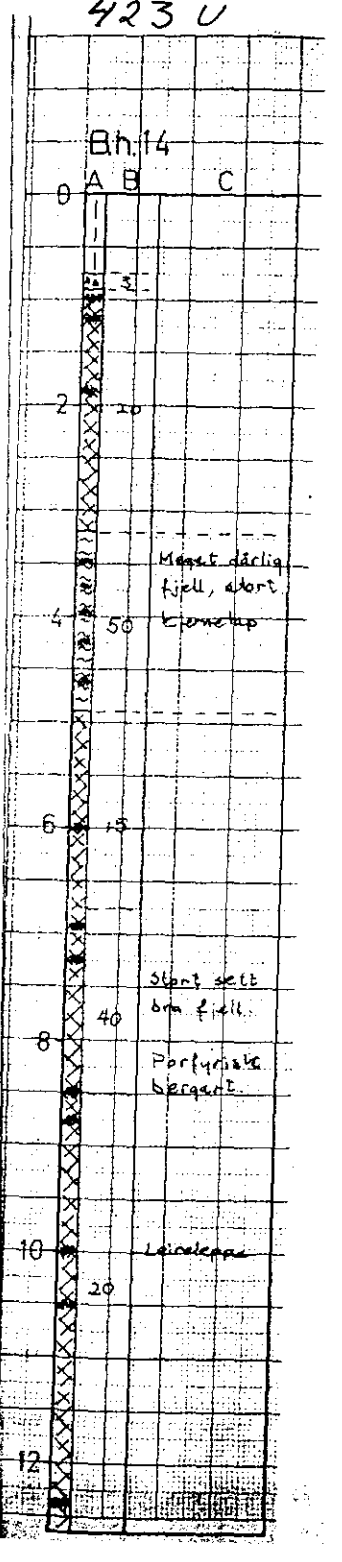

VSGRUNNBORING OSLO 1 PILESTREDET 17	OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR BISLETBEKKENS OMLEGGING BORING NR. 14 (RÅDHUSGT.) SO: B7 IV	707–14 9/6, 1970
